

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto		Pavimentación CARRERA 7 ENTRE CALLES 2 Y 13, LA PRIMAVERA. VIA PERIMETRAL DESDE RUTA 4015 HASTA BARRIO CASTILLO REAL Y BRIGADA 28 A COLEGIO CARRANZA Puerto Carreño, La Primavera, Vichada										
Código BPIN		2017000070002			Sector reclasificado SMSE			Transporte - Vial Red Secundaria				
Localización		Departamento		Municipio				No. Beneficiarios		23,054		
		VICHADA		LA PRIMAVERA								
		VICHADA		PUERTO CARREÑO								
Plazo inicial (meses)		Plazo transcurrido (meses)		Plazo estimado (meses)		Fecha Inicio			Fecha Final			
Productos								Unidad		Cantidad		
Vía urbana pavimentada								Metros lineales de vías urbanas		4500		

APROBACIÓN

Ocad	Región Del Llano	Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Destino recursos	EJECUCION	
Entidad Ejecutora		VICHADA		Entidad Interventora		VICHADA
Acuerdo		Fecha		Ocad		
017		11/08/2017		Región Del Llano		
Ajustes						
No.	Número	Tipo		Ocad	Acuerdo	Fecha

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuentes	Entidad aportante (1)	Valor (2)	%	Valor compromisos (3)	Valor pagos (4)	Saldo por fuente (5)=(2)-(4)
SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		7,499,993,994	100.00	0	0	7,499,993,994
Fondo De Compensación Regional	VICHADA	7,499,993,994	100.00	0	0	7,499,993,994
TOTAL FUENTES APROBADAS		7,499,993,994	100.00	0	0	7,499,993,994
TOTAL FUENTES		7,499,993,994	100.00	0	0	7,499,993,994

EJECUCIÓN Estado: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN



CONTRATACIÓN

N° Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%	
--------------	------	-------	-------	---	--



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:18 PM


INDICADORES

Indicador	Meta	Unidad	Cantidad Ejecutada	% Ejecución
Vía urbana mejorada	4500	Metros lineales	0	.00



CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN ACTUAL

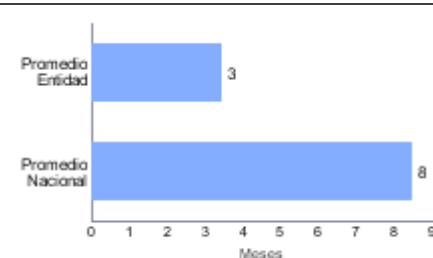

Fuente: GESPROY-SGR


TIEMPO DE INICIO DE CONTRATACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INICIAL


RELACIÓN AVANCE FINANCIERO VS. AVANCE FÍSICO

Calculado entre la fecha de aprobación y la apertura del primer proceso de contratación

Calculado en meses para proyectos con programación en GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR



Fuente: GESPROY-SGR

PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN

# Periodo	Periodo	% Programación inicial acumulada	% Programación actual acumulada	% Ejecutada acumulada	% Avance Financiero
-----------	---------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------

ALERTAS



Fecha reporte

Thursday February 8 2018 6:18 PM

Tipo Alerta	Eventos	Sin subsanar
No reporte de información-NRI	GESPROY-SGR	1
	SUBTOTAL	1
	TOTAL	1
